北江干流英德龙尾山至浈阳大桥段河道清淤工程江湾腩航段右侧施工期助航标志配布示意图

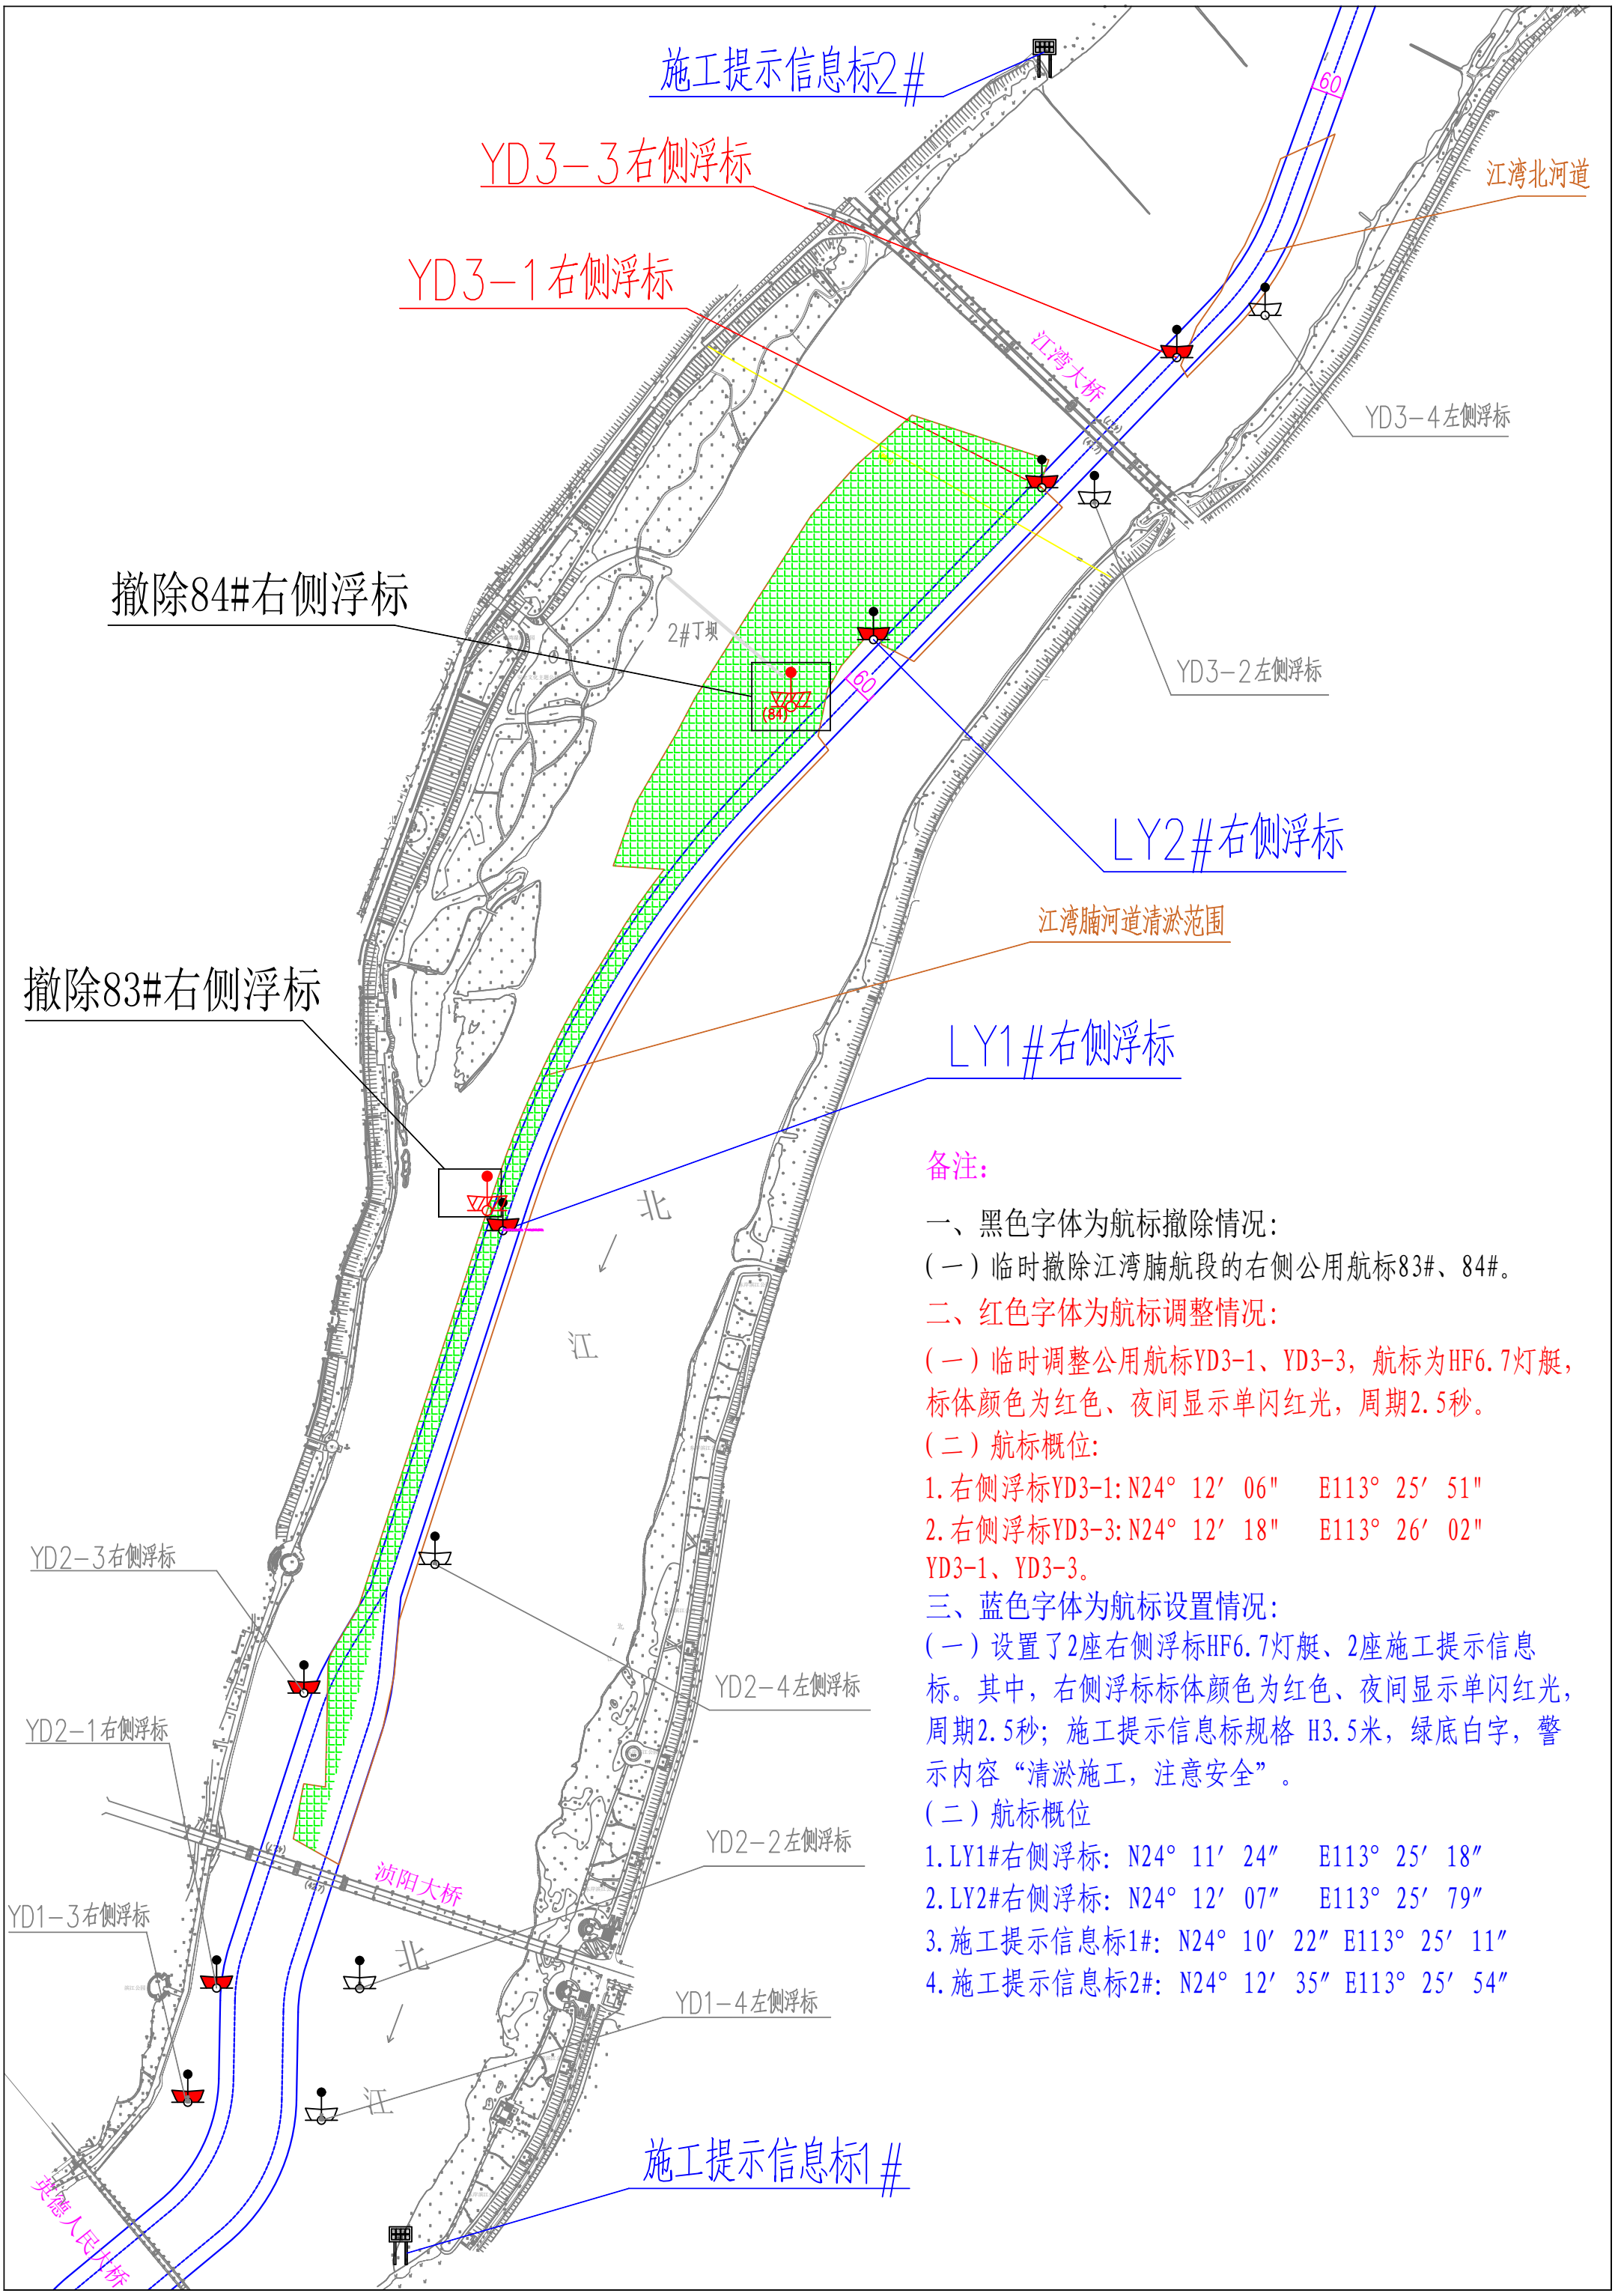

备注:

一、黑色字体为航标撤除情况:

(一)临时撤除江湾腩航段的右侧公用航标83#、84#。

二、红色字体为航标调整情况:

(一)临时调整公用航标YD3-1、YD3-3，航标为HF6.7灯艇，标体颜色为红色、夜间显示单闪红光，周期2.5秒。

(二)航标概位:

1.右侧浮标YD3-1:N24° 12′ 06"　E113° 25′ 51"

2.右侧浮标YD3-3:N24° 12′ 18"　E113° 26′ 02"

YD3-1、YD3-3。

三、蓝色字体为航标设置情况:

(一)设置了2座右侧浮标HF6.7灯艇、2座施工提示信息标。其中，右侧浮标标体颜色为红色、夜间显示单闪红光，周期2.5秒；施工提示信息标规格 H3.5米，绿底白字，警示内容“清淤施工，注意安全”。

(二)航标概位

1.LY1#右侧浮标: N24° 11′ 24″　E113° 25′ 18″

2.LY2#右侧浮标: N24° 12′ 07″　E113° 25′ 79″

3.施工提示信息标1#: N24° 10′ 22″ E113° 25′ 11″

4.施工提示信息标2#: N24° 12′ 35″ E113° 25′ 54″
